Terminplan V1

eConnect

Alte Landstrasse 331-341, 8708 Männedorf, Bellagio, PVA [2023.0166]

Datum: 24.10.2023

Unternehmen	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
Toni's Gerüstservice	Gerüst stellen Haus 331, 333	15.01.24	2	16.01.24
Toggenburger AG	Krantermin für Häuser 331, 333, 335	16.01.24	1	16.01.24
Toi Toi AG	Aufstellen Baustellen-WC	16.01.24	1	16.01.24
eConnect GmbH	Montage Wechselrichter alle Häuser	16.01.24	3	18.01.24
eConnect GmbH	Montage PV Anlage Haus 331	22.01.24	10	02.02.24
eConnect GmbH	Montage PV Anlage Haus 333	29.01.24	10	09.02.24
Toni's Gerüstservice	Gerüst umstellen zu Häuser 335, 337	09.02.24	2	12.02.24
eConnect GmbH	Montage PV Anlage Haus 335	12.02.24	10	23.02.24
Schmid AG	Krantermin für Häuser 337, 339, 341	13.02.24	1	13.02.24
eConnect GmbH	Montage PV Anlage Haus 337	19.02.24	10	01.03.24
Toni's Gerüstservice	Gerüst umstellen zu Häuser 339, 341	01.03.24	2	04.03.24
eConnect GmbH	Montage PV Anlage Haus 339	04.03.24	10	15.03.24
eConnect GmbH	Montage PV Anlage Haus 341	11.03.24	10	22.03.24
Toni's Gerüstservice	Gerüst Abbau Häuser 339, 341	14.03.24	2	15.03.24
eConnect GmbH	Wechselrichter Anschluss und Konfiguration	18.03.24	5	22.03.24
Toi Toi AG	Abbau Baustellen-WC	22.03.24	1	22.03.24
EW, Elektroinstallateur	Zählerwechsel, Termin mit Verantwortlichem	26.03.24	2	27.03.24
eConnect GmbH	Inbetriebnahme alle Häuser	27.03.24	2	28.03.24
Bauherr	Instruktionen und Übergabe	01.04.24	1	01.04.24

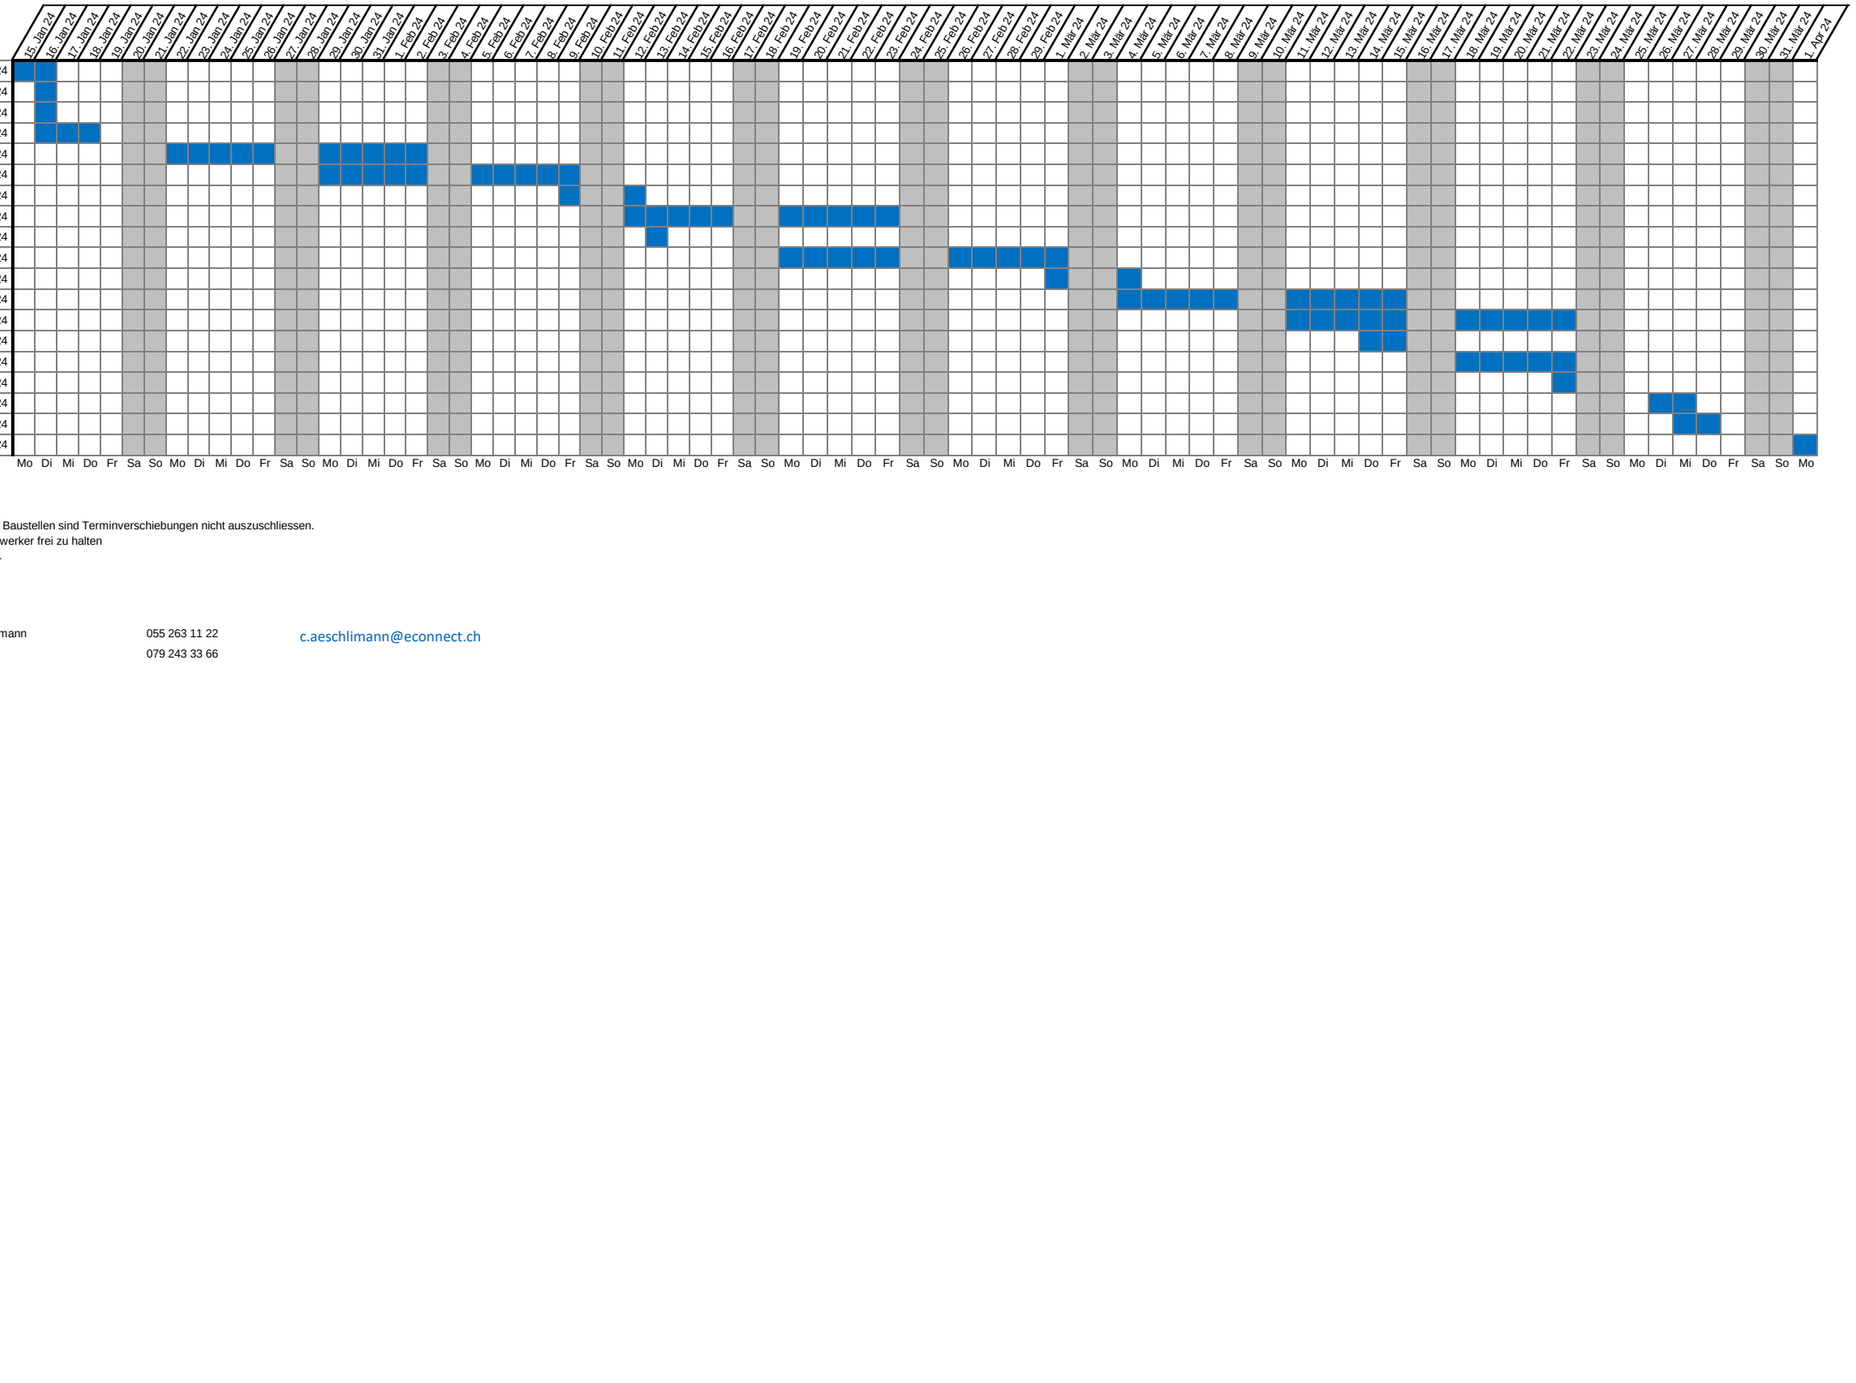

Wichtige Informationen

Witterungsbedingt und bedingt durch Arbeitsabläufe auf dieser und vorhergehenden Baustellen sind Terminverschiebungen nicht auszuschliessen.
Während der Bauphase sind Zugänge und Platz rund um das Gebäude für die Handwerker frei zu halten
Während der Bauphase sind Behinderungen durch Gerüste, Materialdepots möglich.

Ansprechpersonen:

eConnect	Christof Aeschlimann	055 263 11 22	c.aeschlimann@econnect.ch
Toni's Service	Toni	079 243 33 66	
